ISG · BACHELOR 3

Stratégie et gouvernance de l'IA

Fiches de cours : les notions des quatre sessions, avec leurs schémas

Pierrick Briand · octobre 2026
Application du cours : pierrickbriand.github.io/gouvernance-ia-b3

SESSION 1 · 16 SEPTEMBRE 2026

Séminaire 1 : piloter un projet IA

Cadrer	Chiffrer	Faire adopter	Gouverner	Décider
séminaire 1	séminaire 1, cours 1	cours 1	séminaire 2	cours 2

1 · Du diagnostic au projet

> **Projet IA :** une démarche organisée pour **concevoir**, **déployer** et **faire adopter** un usage de l'IA. Elle a un objectif, un périmètre, un budget, un calendrier et des responsables.

> **Cadrage de projet :** la phase initiale. Elle formalise le problème, les objectifs, le périmètre, les parties prenantes, les moyens, les risques et les critères de succès.

Le projet prolonge le cas d'usage (L1) et le diagnostic IA (L2).

2 · Sept composants

Composant	La question
Problème traité	Que résout-on, du point de vue métier ?
Objectifs mesurables	Que vise-t-on, chiffré et daté ?
Périmètre	Qu'est-ce qui est inclus, et exclu ?
Parties prenantes	Qui est concerné, qui décide, qui subit ?
Moyens	Quel budget, quelles ressources, quels outils ?
Risques	Qu'est-ce qui peut échouer, et quel plan ?
Critères de succès	Comment saura-t-on, indicateurs à l'appui ?

3 · Les parties prenantes

> **Partie prenante :** une personne ou un groupe **concerné** par le projet, ou capable de l'**influencer**.

Pour chacune, on note son **intérêt** (soutient ou s'oppose, et pourquoi) et son **pouvoir** (fort, moyen, faible).

EXEMPLE · VOTRE CAS

Cas A, Le Slip Français : la direction a retenu un projet d'assistance à la production de contenus (fiches produits, courriels, réseaux sociaux) et au service client, sur un périmètre marketing et relation client.
Cas B, Faguo : la direction a retenu un projet d'assistance et d'agent avec humain dans la boucle sur les réclamations et le rapprochement des factures transporteurs, sur un périmètre finance et opérations.
Qui subit le changement ? C'est souvent elle qui peut bloquer.

4 · Coûts et ROI prudent

Cinq postes de coûts : abonnement ou usage, intégration, formation, maintenance, supervision humaine.

- Chiffrer les coûts complets, supervision comprise ;
- chiffrer les gains prouvables ;
- appliquer la décote : **gains divisés par deux, coûts doublés** ;
- vérifier que ça tient.

Un éditeur promet 30 % de productivité ? Demandez comment le chiffre a été mesuré.

5 · Conduite du changement

> **Conduite du changement :** les actions qui font **adopter durablement** un outil : communiquer, former, accompagner, impliquer les équipes.

« Une bonne solution technique s'impose d'elle-même. » **Faux** : c'est l'adoption qui décide.

Deux notions d'ouverture, sans quiz : la **dette technique** et le **MLOps**. Elles reviennent en M1 et M2.

6 · À retenir

- Un projet IA a un objectif, un périmètre, un budget, un calendrier et des responsables ;
- un cadrage se lit en sept composants ;
- le modèle de coûts compte la supervision et la formation ;
- un ROI prudent divise les gains par deux et double les coûts ;
- la conduite du changement commence dès le cadrage.

Je vérifie : le ROI prudent prend-il les chiffres de l'éditeur ?
Non. On décote : gains divisés par deux, coûts doublés.

Sources : livret et diaporama du séminaire 1 (V2) ; fiches de cas du module, annexe A. Exemples chiffrés : hypothèses fictives.

SESSION 2 · 16 SEPTEMBRE 2026

Séminaire 2 : gouverner un projet IA

Cadrer	Chiffrer	Faire adopter	Gouverner	Décider
séminaire 1	séminaire 1, cours 1	cours 1	séminaire 2	cours 2


1 · Qui répond de l'outil ?

Selon Upmynt (n° 355), Microsoft a présenté Autopilot, un **agent persistant** : il continue de travailler seul.

Trois questions pour tout système d'IA : **qui l'a autorisé** ? **Qui le surveille** ? **Qui répond de ses erreurs** ?

C'est une newsletter qui relaie l'information. Un document professionnel remonte à la source.

2 · Trois niveaux

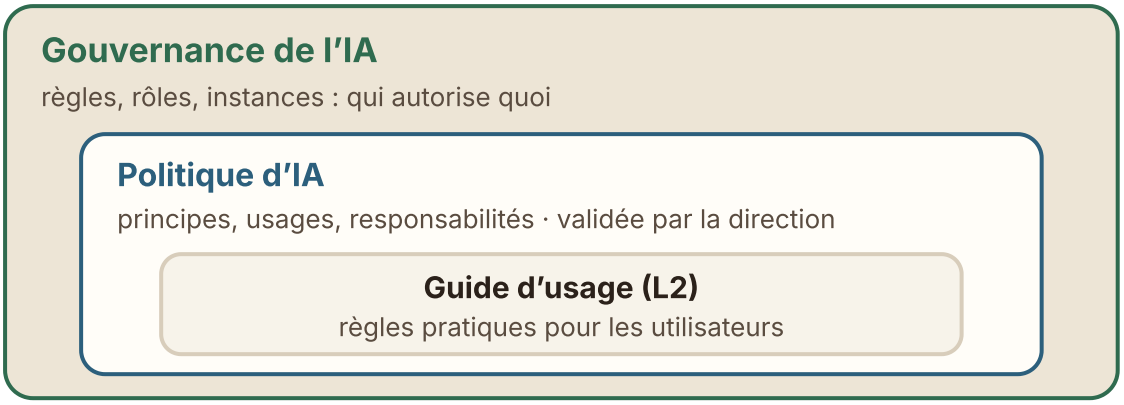

La politique englobe le guide ; la gouvernance la fait vivre.

3 · Le registre

> **Registre des systèmes d'IA :** l'inventaire tenu à jour des systèmes d'IA de l'organisation.

Pour chaque système : sa **finalité**, ses **données**, son **niveau de risque** (AI Act, vu en L1) et son **responsable**.

EXEMPLE · VOTRE CAS

Système du cas A : un assistant d'aide à la rédaction de fiches produits, de courriels et de publications pour l'équipe marketing du Slip Français.
Système du cas B : un agent d'aide au traitement des réclamations clients et au suivi des commandes de Faguo, avec humain dans la boucle.

4 · Conformité opérationnelle

> **Analyse d'impact :** une évaluation **préalable** et documentée des effets d'un système sur les personnes et sur l'organisation.

> **Responsabilité (accountability) :** l'organisation doit pouvoir **démontrer**, preuves à l'appui, qu'elle respecte ses obligations.

> **Comité de gouvernance :** l'instance qui autorise les projets, arbitre les cas litigieux et suit les risques.

5 · Une idée reçue

« La gouvernance freine l'innovation. »

Pas si elle est proportionnée au risque. Elle accélère les projets sans risque. Elle ralentit seulement ceux qui en ont.

Sans gouvernance, un incident arrive sans responsable identifié.

6 · À retenir

- Guide d'usage, politique, gouvernance : trois niveaux distincts ;
- un registre dit quels systèmes existent, pour quoi, sous quelle responsabilité ;
- l'analyse d'impact précède le déploiement d'un système à haut risque ;
- la responsabilité se démontre, preuves à l'appui.

Je vérifie : le registre remplace-t-il l'analyse d'impact ?
Non. Le registre inventorie, l'analyse d'impact évalue.

Sources : livret et diaporama du séminaire 2 (V2) ; Upmynt, numéro 355, 28 septembre 2026, qui relaie Axios et Gartner.

SESSION 3 · 7 OCTOBRE 2026

Cours 1 : du cadrage au dossier défendable

Cadrer séminaire 1 | Chiffrer séminaire 1, cours 1 | **Faire adopter cours 1** | Gouverner séminaire 2 | Décider cours 2

1 · Un objectif solide

Un objectif solide contient **quatre éléments** : l'indicateur de performance, la valeur de départ, la valeur cible et l'échéance.

EXEMPLE FICTIF

Passer le temps de traitement d'une réclamation de 48 heures à 24 heures d'ici juin 2027.

2 · Lire les parties prenantes


	Soutient	S'oppose
Pouvoir fort	**Embarquer** en faire des relais	**Convaincre** avant tout le reste
Pouvoir faible	**Tenir informé** sans surcharger	**Écouter** comprendre ses craintes

Une partie prenante forte qui s'oppose se convainc avant tout le reste.

Chaque action du plan d'adoption vise une partie prenante listée.

3 · Un ROI prudent, calculé

Gain brut : 18 h par semaine, 46 semaines, 35 € de l'heure. Coûts : cinq postes, supervision comprise.

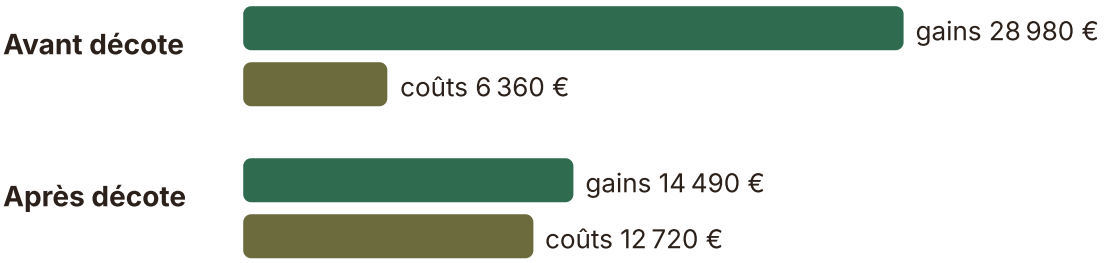

Rapport après décote : 14 490 ÷ 12 720 = 1,14. Le projet tient, de justesse.

Hypothèses fictives. Décote : gains ÷ 2, coûts × 2.

Gain net prudent : 1 770 €.

4 · Les promesses des éditeurs

« Notre agent traite 80 % des réclamations sans intervention humaine. »

Un chiffre isolé ne prouve rien. Que mesure-t-il ? Quand ? Sur quel échantillon ?

Pour chaque promesse : **vérifiable** ou **invérifiable en l'état** ? Quelle **preuve** demander ?

5 · Le plan d'adoption

- **Communiquer** : le pourquoi avant le comment, avec des exemples ;
- **former et accompagner** : petits groupes, cas réels, un référent ;
- **impliquer** : associer les équipes au choix, recueillir leurs retours.

Le dossier de cadrage tient sur **une page**, en **huit blocs** : les sept composants plus le plan d'adoption.

6 · À retenir

- Un objectif : un indicateur, un départ, une cible, une date ;
- une partie prenante forte qui s'oppose se convainc avant tout ;
- cinq postes de coûts, supervision comprise ;
- après décote, les gains bruts doivent dépasser quatre fois les coûts bruts.

Je vérifie : « Réduire le temps de réponse de 48 h à 24 h », objectif solide ?
Pas encore : il manque l'échéance, et l'indicateur reste flou (première réponse ou résolution ?).

Sources : livret, diaporama et corrigé du cours 1 (V2). Les montants de l'exemple calculé sont des hypothèses fictives.

SESSION 4 · 21 OCTOBRE 2026

Cours 2 : gouverner l'IA en entreprise

Cadrer	Chiffrer	Faire adopter	Gouverner	Décider
séminaire 1	séminaire 1, cours 1	cours 1	séminaire 2	cours 2


1 · Trois questions

Qui autorise ? le comité, selon des critères → **Qui surveille ?** le registre, le suivi régulier → **Qui répond ?** un responsable désigné

sans réponse claire, un incident arrive sans responsable

Selon Upmynt (n° 355), OpenAI et Anthropic enquêtent sur des dizaines de milliers d'incidents liés au comportement de leurs IA.

2 · De la charte à la gouvernance

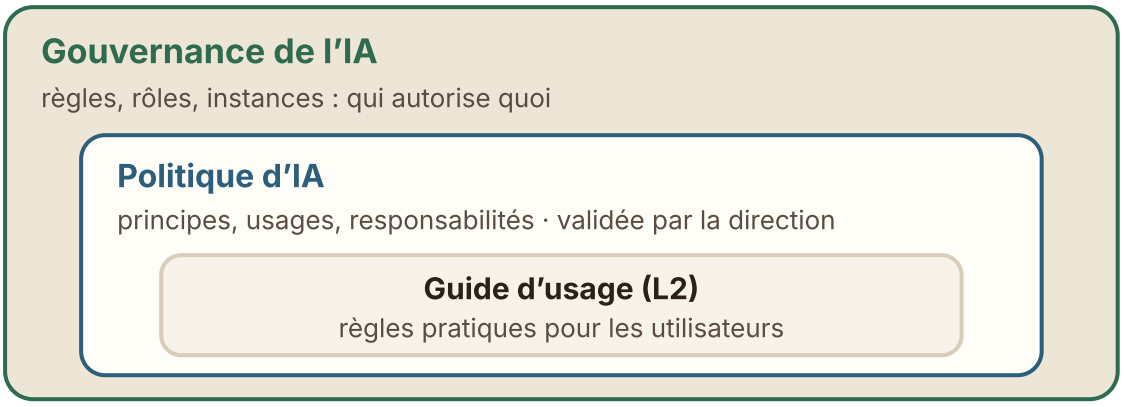

La politique englobe le guide ; la gouvernance la fait vivre.


> **Registre :** l'inventaire des systèmes, avec finalité, données, niveau de risque et responsable.

3 · Conformité opérationnelle

Analyse d'impact : évaluation **préalable** et documentée des effets sur les personnes (droits, vie privée, équité). Le RGPD l'exige pour certains traitements.

Responsabilité (accountability) : démontrer, preuves à l'appui : documentation, traçabilité, un responsable par système.

Gestion des risques : une démarche **continue**, en proportion du niveau de risque.



Un cycle continu, proportionné au niveau de risque.

4 · Le haut risque

Le tri algorithmique de candidatures est un **système à haut risque** au sens de l'AI Act (vu en L2).


- Une analyse d'impact préalable ;
- un contrôle humain systématique ;
- une documentation, pour pouvoir démontrer.

EXEMPLE · NORDIA (CAS FICTIF)

Le client de NORDIA a déployé un pilote **sans analyse d'impact**. Il veut maintenant généraliser l'outil.

5 · Le comité NORDIA

Cinq rôles : direction du client, juridique, consultants NORDIA, représentants des candidats, éditeur de l'outil.



Remise de la décision à 11 h 25. À l'heure dite, le comité décide, même sans unanimité.

Votre comité décide : **autoriser**, **refuser** ou **autoriser sous conditions**. Aucune décision n'est « la bonne » : la motivation compte.

La décision motivée a **cinq parties** : instruction, notions, décision, motivation, conditions de suivi.

6 · À retenir

- Guide, politique, gouvernance : trois niveaux ;
- registre, analyse d'impact, responsabilité : la conformité au quotidien ;
- la gouvernance proportionnée accélère les projets sans risque ;
- une décision de comité se motive et prévoit son suivi.

Je vérifie : l'éditeur annonce « zéro biais ». Le comité peut-il s'en contenter ?
Non. Une affirmation d'absence totale appelle une preuve indépendante : un audit.

Sources : livret et diaporama du cours 2 (V2) ; Upmynt, numéro 355, 28 septembre 2026. NORDIA est un cas fictif.
